

Légende

Phase A2 : 29 Septembre 2025 - 7 Novembre 2025 Hors intempérie

- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Rabotage des enrobés
- Démolition de chaussée
- Terrassement
- Assainissement
- Structures de chaussée et trottoir
- Bordures
- Revêtement trottoir
- Reprofilage
- Grave bitume
- Livraison phase A

Zone travaux

Base vie

Balise K16

Cheminement piétons (La position du couloir piéton changera en fonction de l'avancement des travaux dans la zone concernée.)

Déviations

Accès riverains et commerces maintenus



EUROVIA

AGENCE DE BORDEAUX

15 rue Thiers 33000 BORDEAUX

05 57 28 28 28

05 57 28 28 28

COMMUNE DE MÉRIGNAC

ALLÉE DES ACACIAS

Date

Modifications

15/07/25

Edoan melle

15/07/25

Modifications avant renvoi

PROJET

MODIFICATIONS

DATE

MODIFICATIONS

15/07/25


Edoan melle

15/07/25

Modifications avant renvoi

PHASAGE A-2

200°

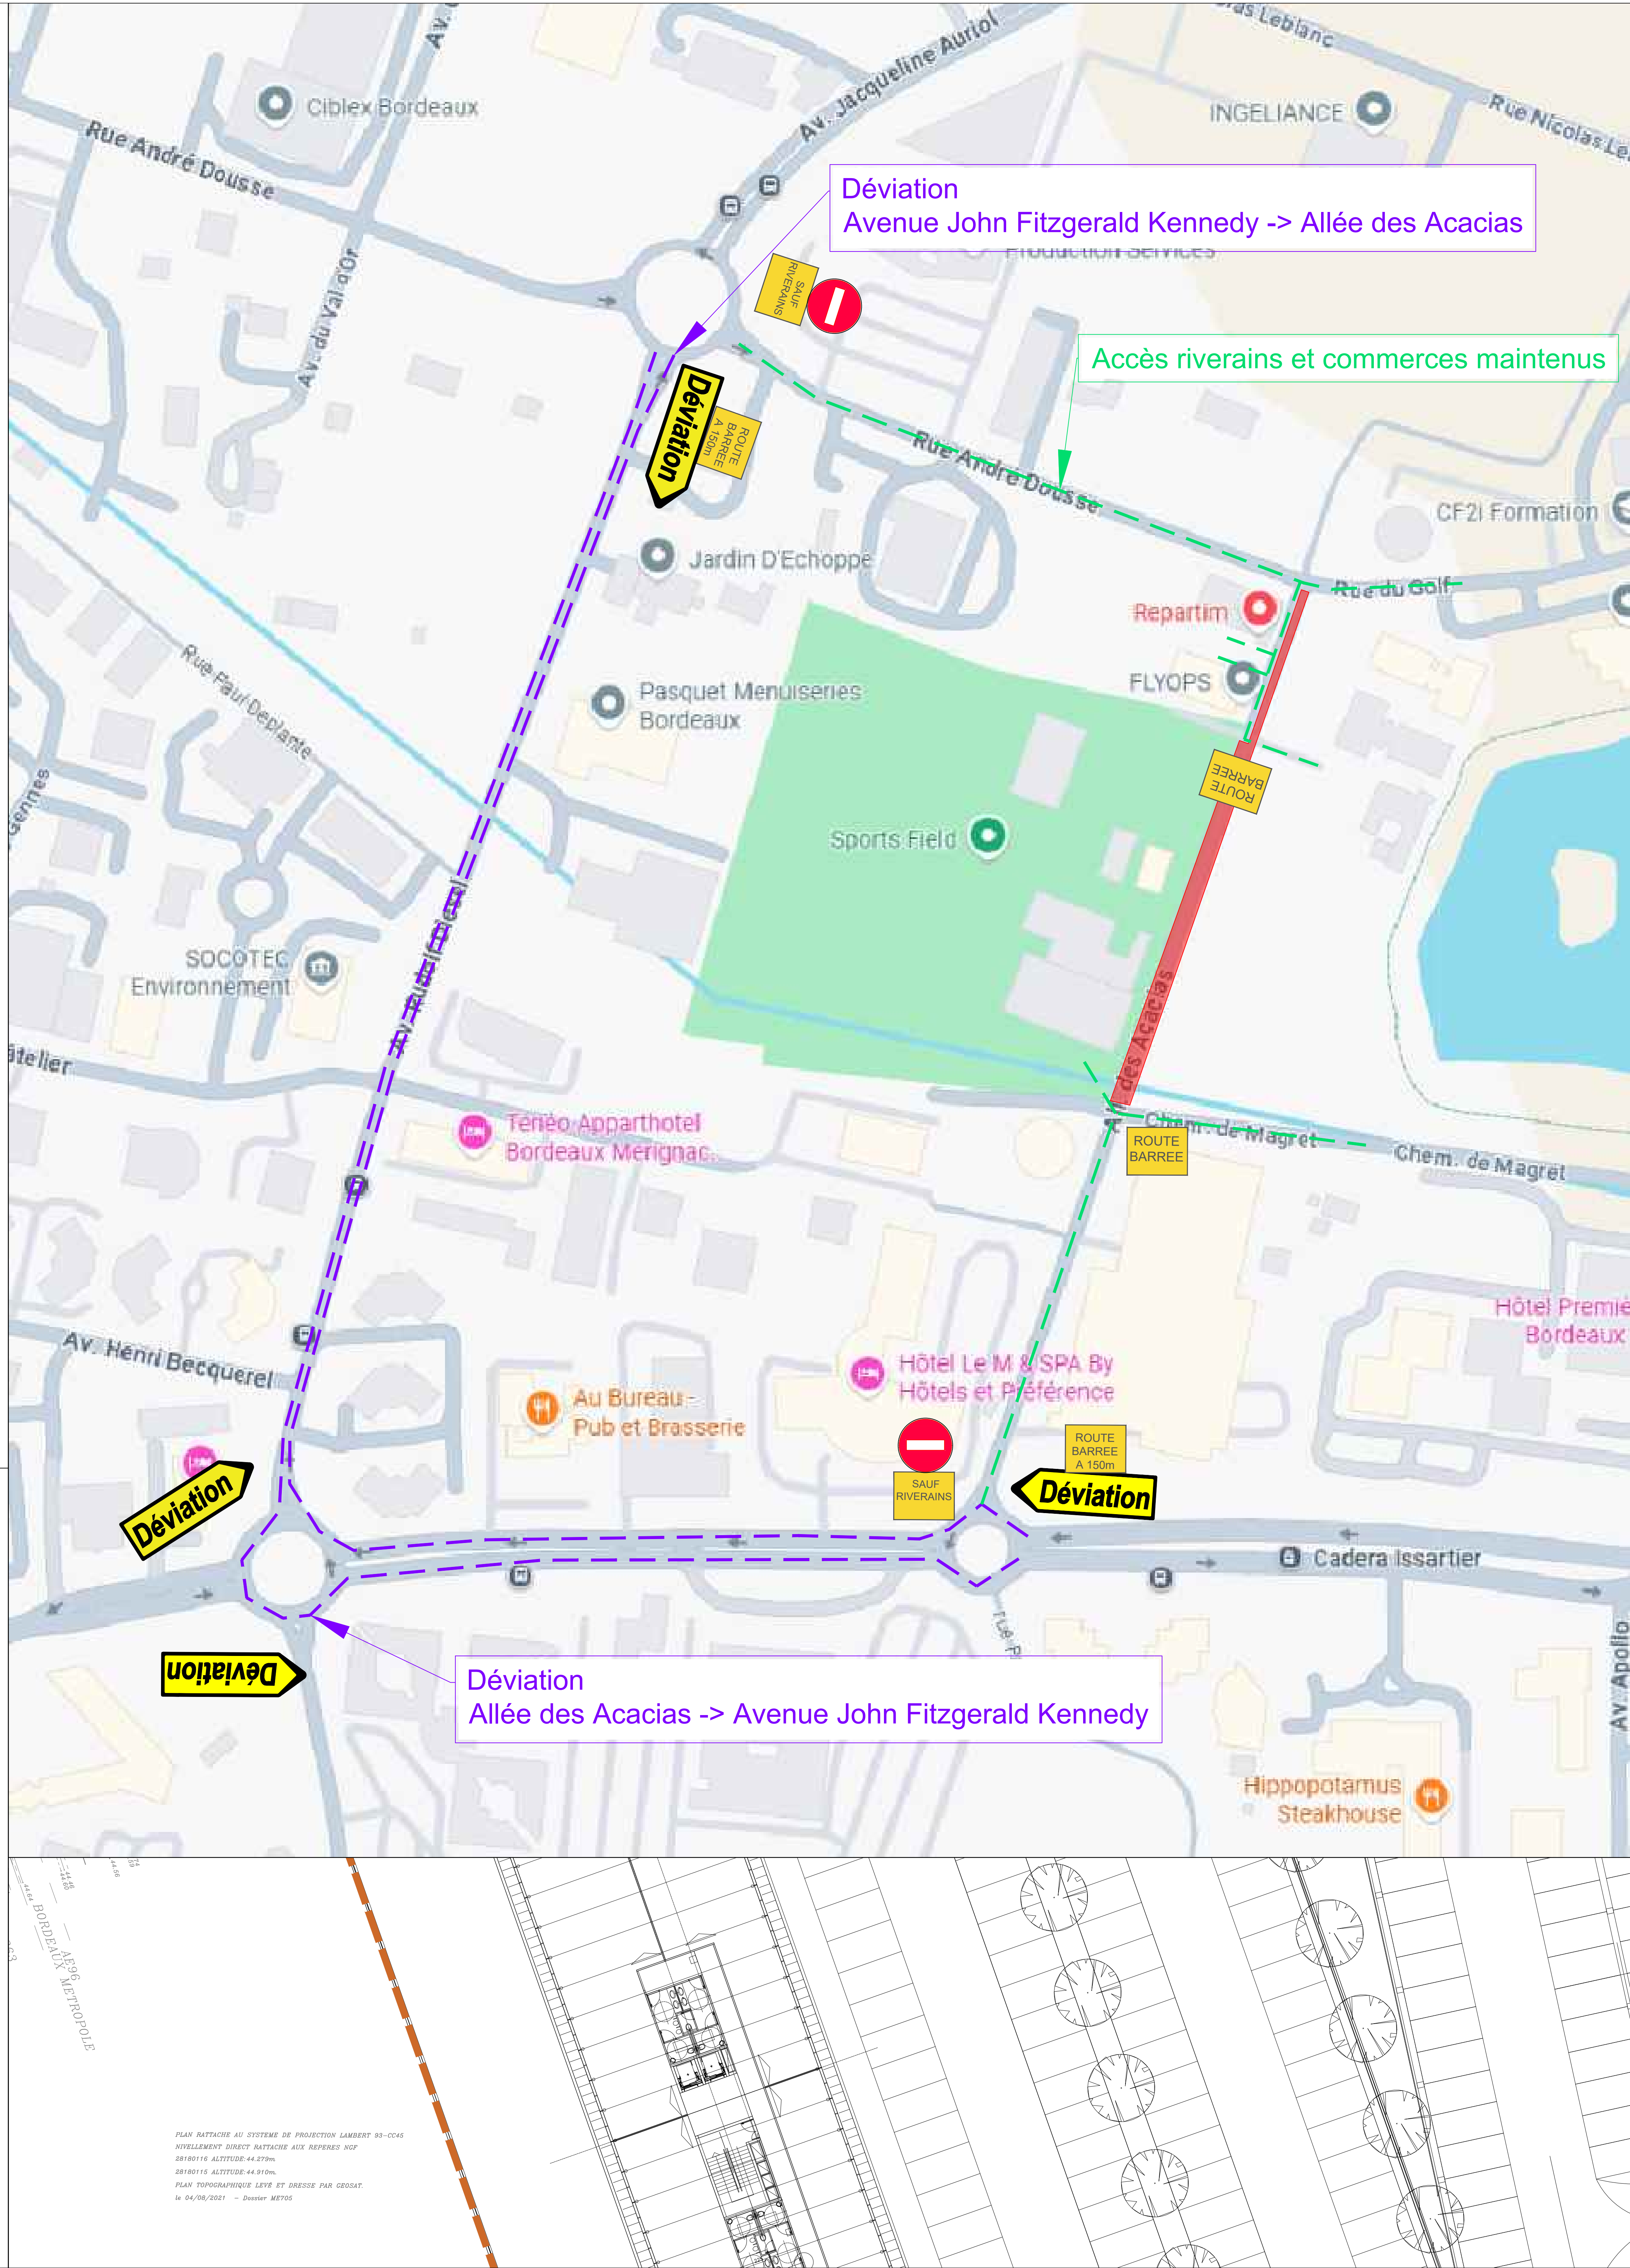

Légende

Phase M1 : 10 Novembre 2025 - 25 Novembre 2025 Hors intempérie

- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Rabotage des emprises
- Démolition de chaussée
- Terrassement
- Assainissement
- Structures de chaussée et trottoir
- Bordures
- Revêtement trottoir
- Grave bitume

Zone travaux

Base vie

Balise K16

Cheminement piétons (La position du couloir piéton changera en fonction de l'avancement des travaux dans la zone concernée.)

Déviaton

Accès riverains et commerces maintenus



EUROVIA

Agence de Bordeaux

10 rue Thiers 33000 BORDEAUX

05 57 20 20 00

05 57 20 20 00

COMMUNE DE MÉRIGNAC

ALLÉE DES ACACIAS

Date	Modifications
15/07/25	Création plan
23/07/25	Modification avant travaux

DUR

BBS

PHASAGE M-1

200°

Légende

Phase M2 : 26 Novembre 2025 - 10 Décembre 2025 Hors intempérie




- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Rabotage des enrobés
- Démolition de chaussée
- Terrassement
- Structures de chaussée et trottoir
- Bordures
- Revêtement trottoir
- Grave bitume

 Zone travaux Base view

 Balise K16

— Cheminement piétons

Deviation

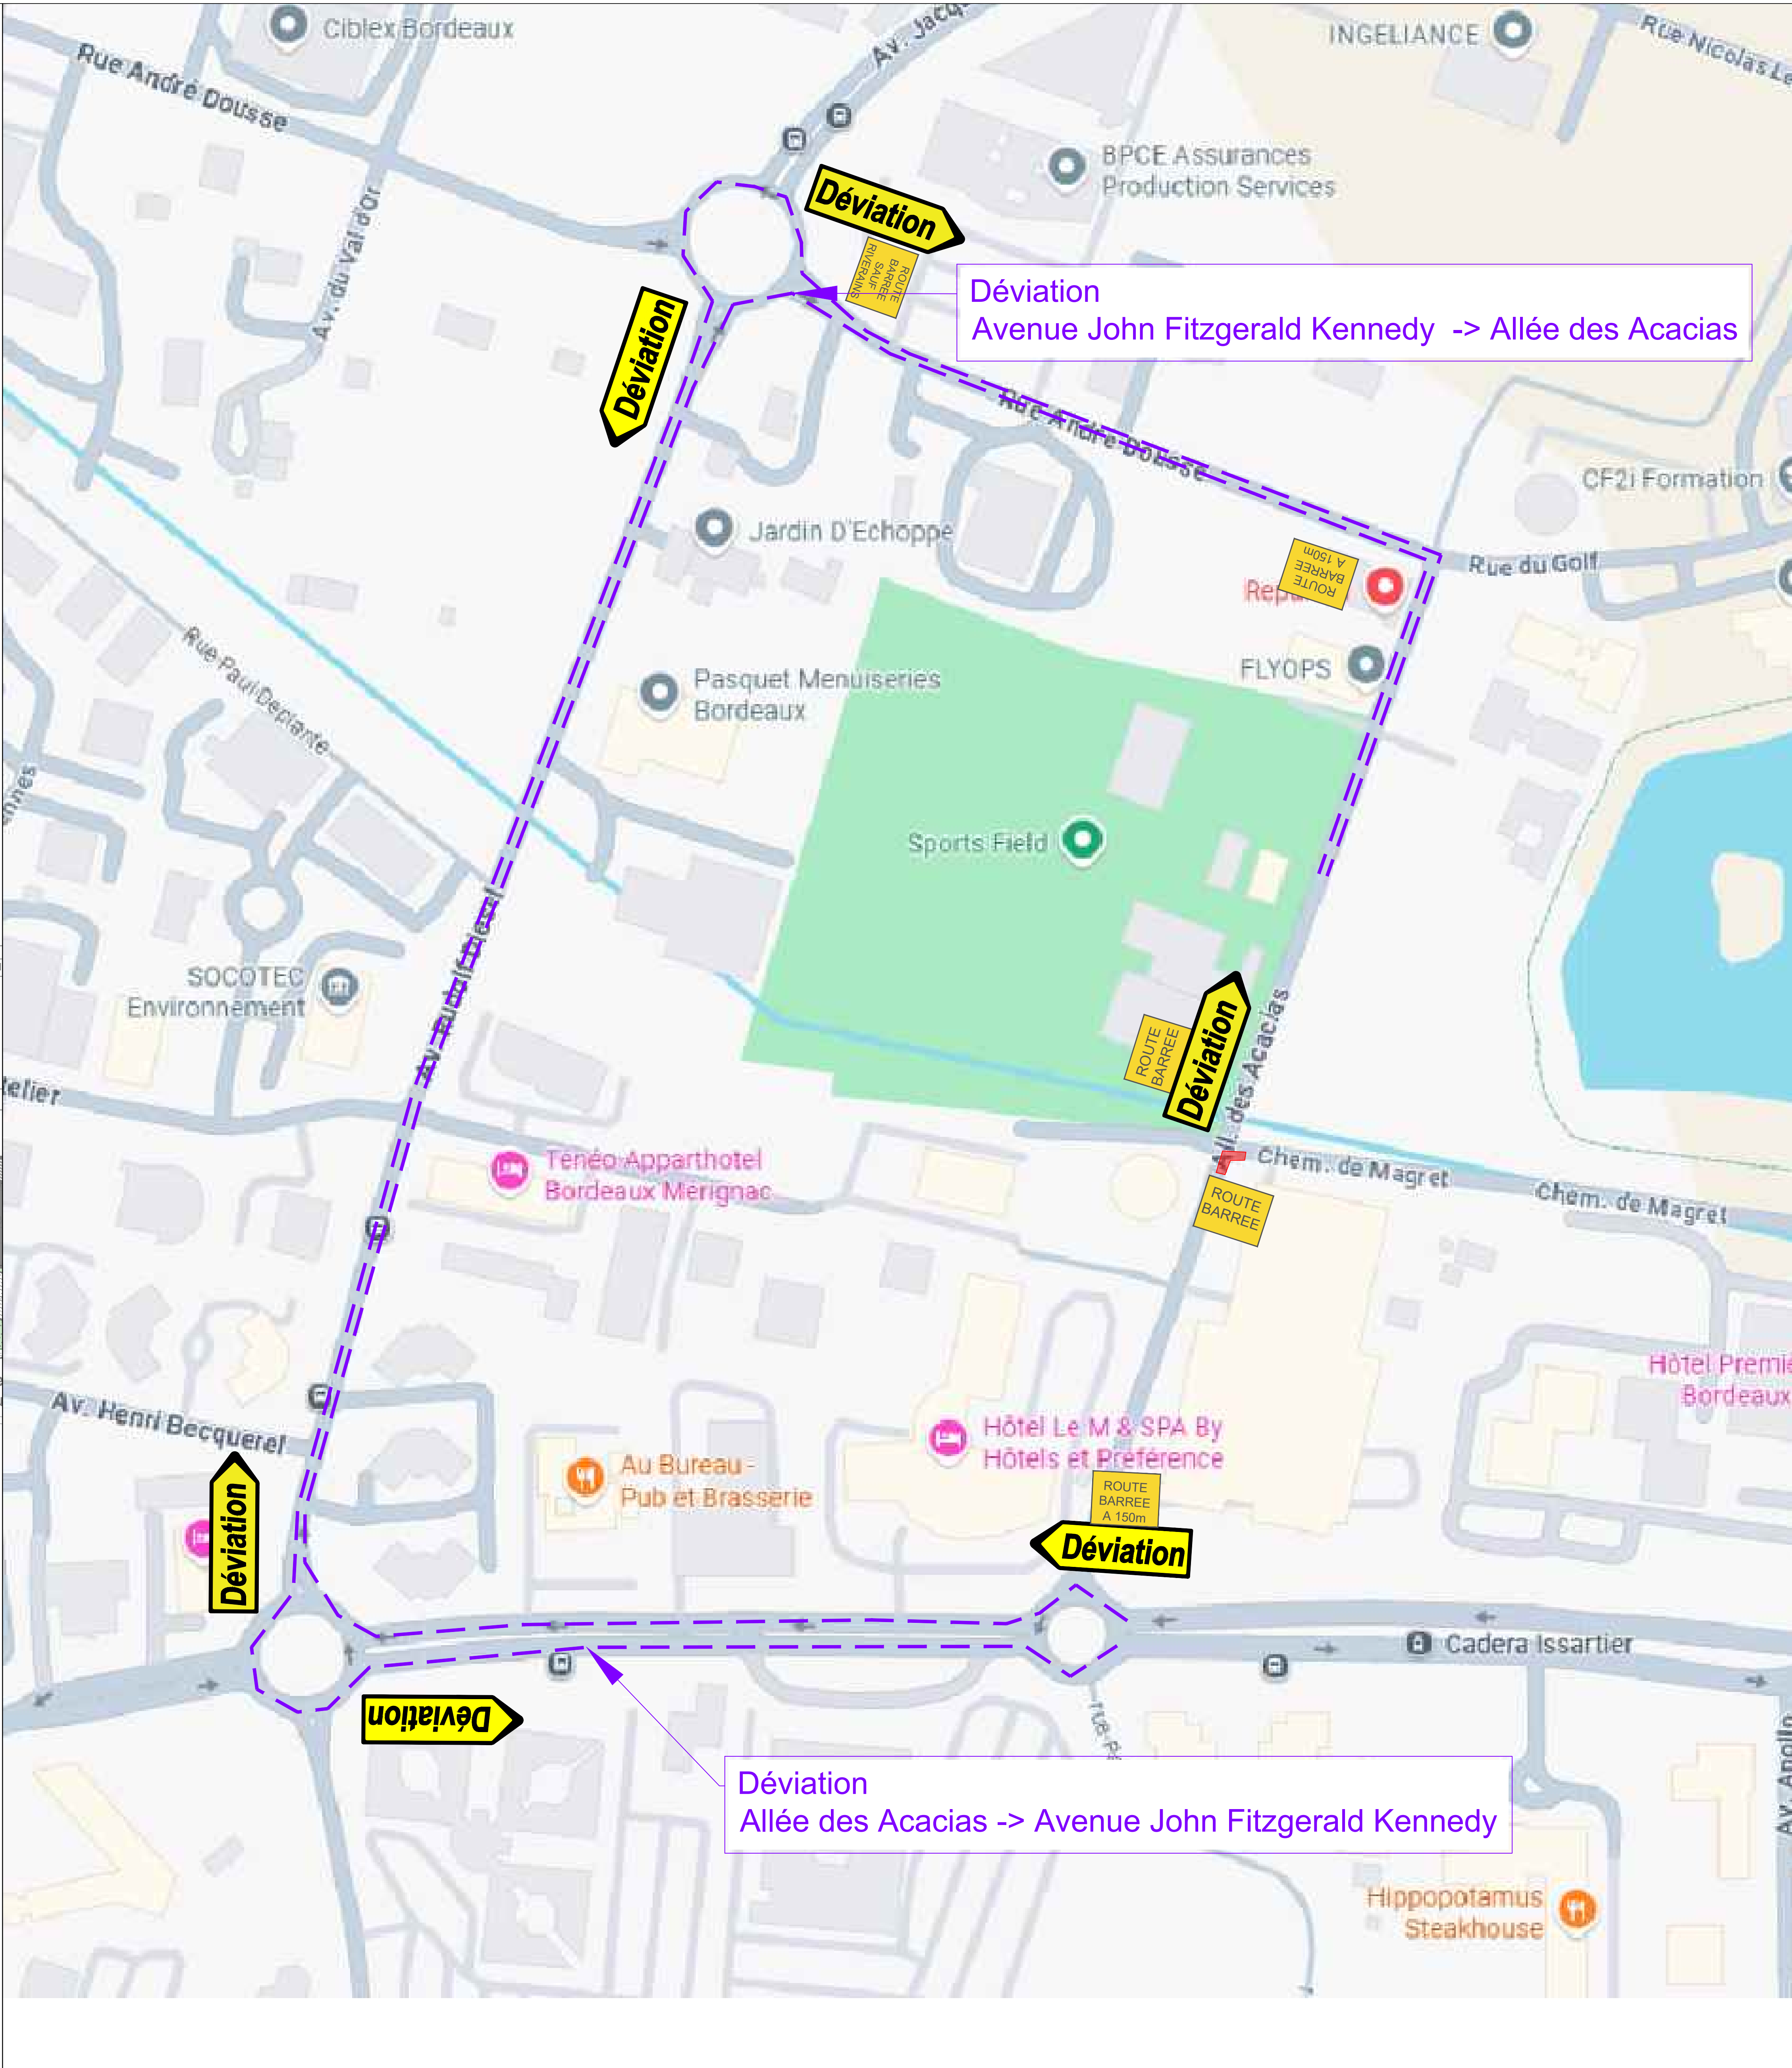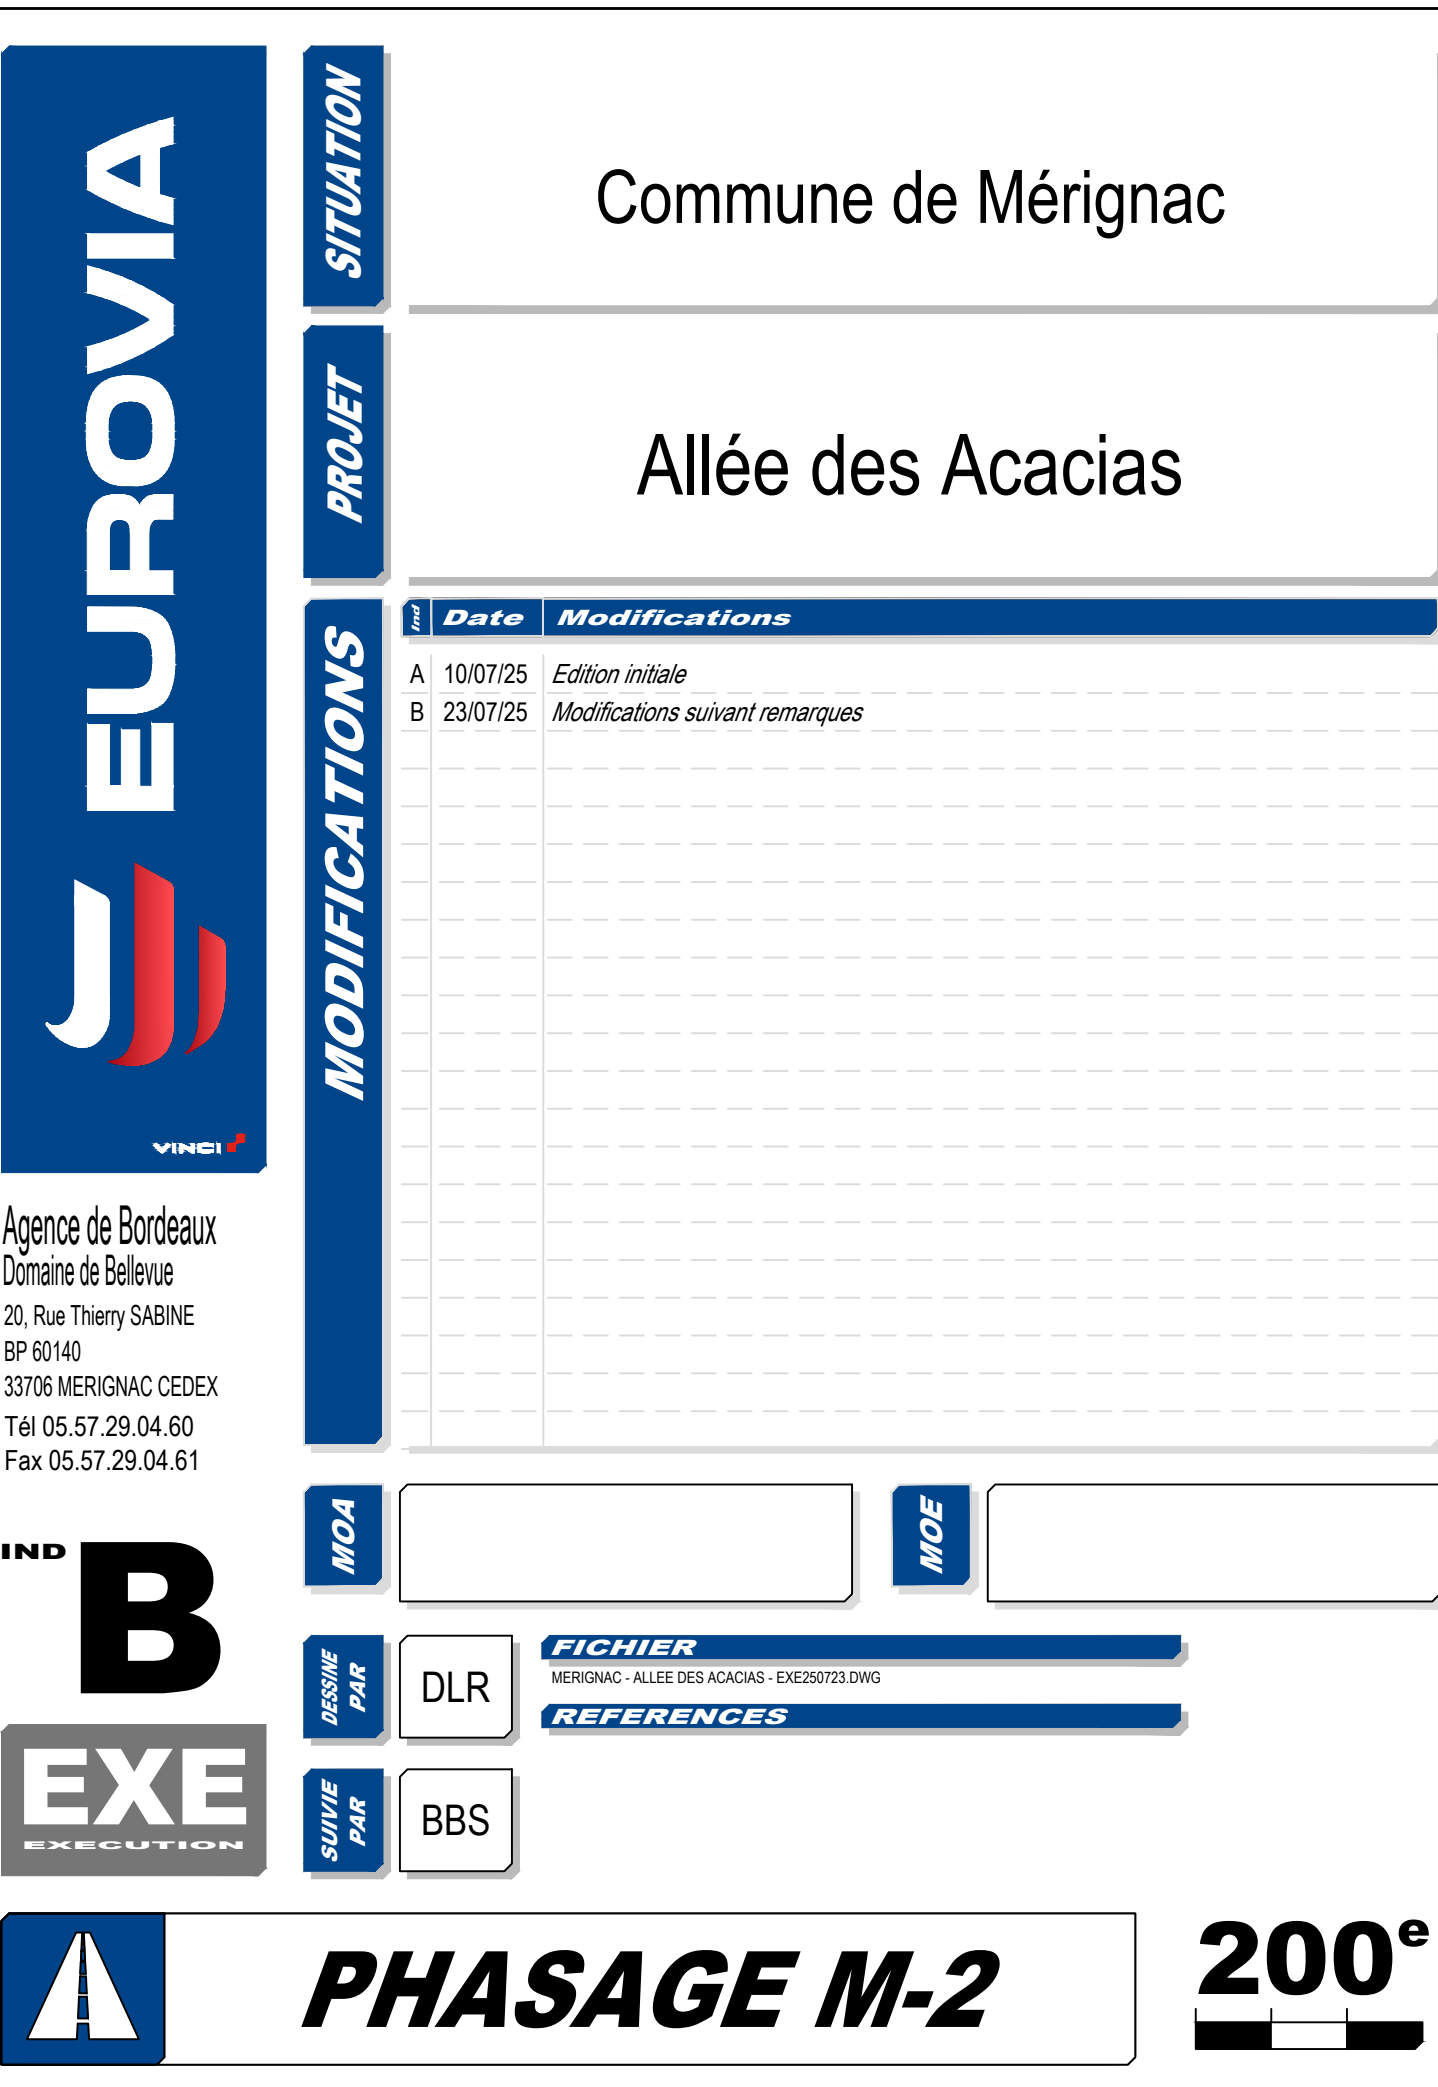[illegible]

Légende

Phase M3 : 10 Décembre 2025 - 11 Décembre 2025 (Nuit) Hors intempérie

Mise en place balisage

Dégagement d'emprise

Reproillage et BBSG de nuit Phase A et M

Livraison Phase M

Zone travaux

Base vie

Balise K16

Cheminement piétons

Déviaton

Accès riverains et commerces maintenus



EUROVIA

Agence de Bordeaux

10 Rue Thiers 33000 BORDEAUX

05 57 00 00 00

05 57 00 00 00

COMMUNE DE MÉRIGNAC

ALLÉE DES ACACIAS

MODIFICATIONS

PROJET

SITUATION

Date

Modifications

15/07/25

Colonne mise à jour

13/07/25



Modifications avant travaux

B

EXE

PHASAGE M-3

200°

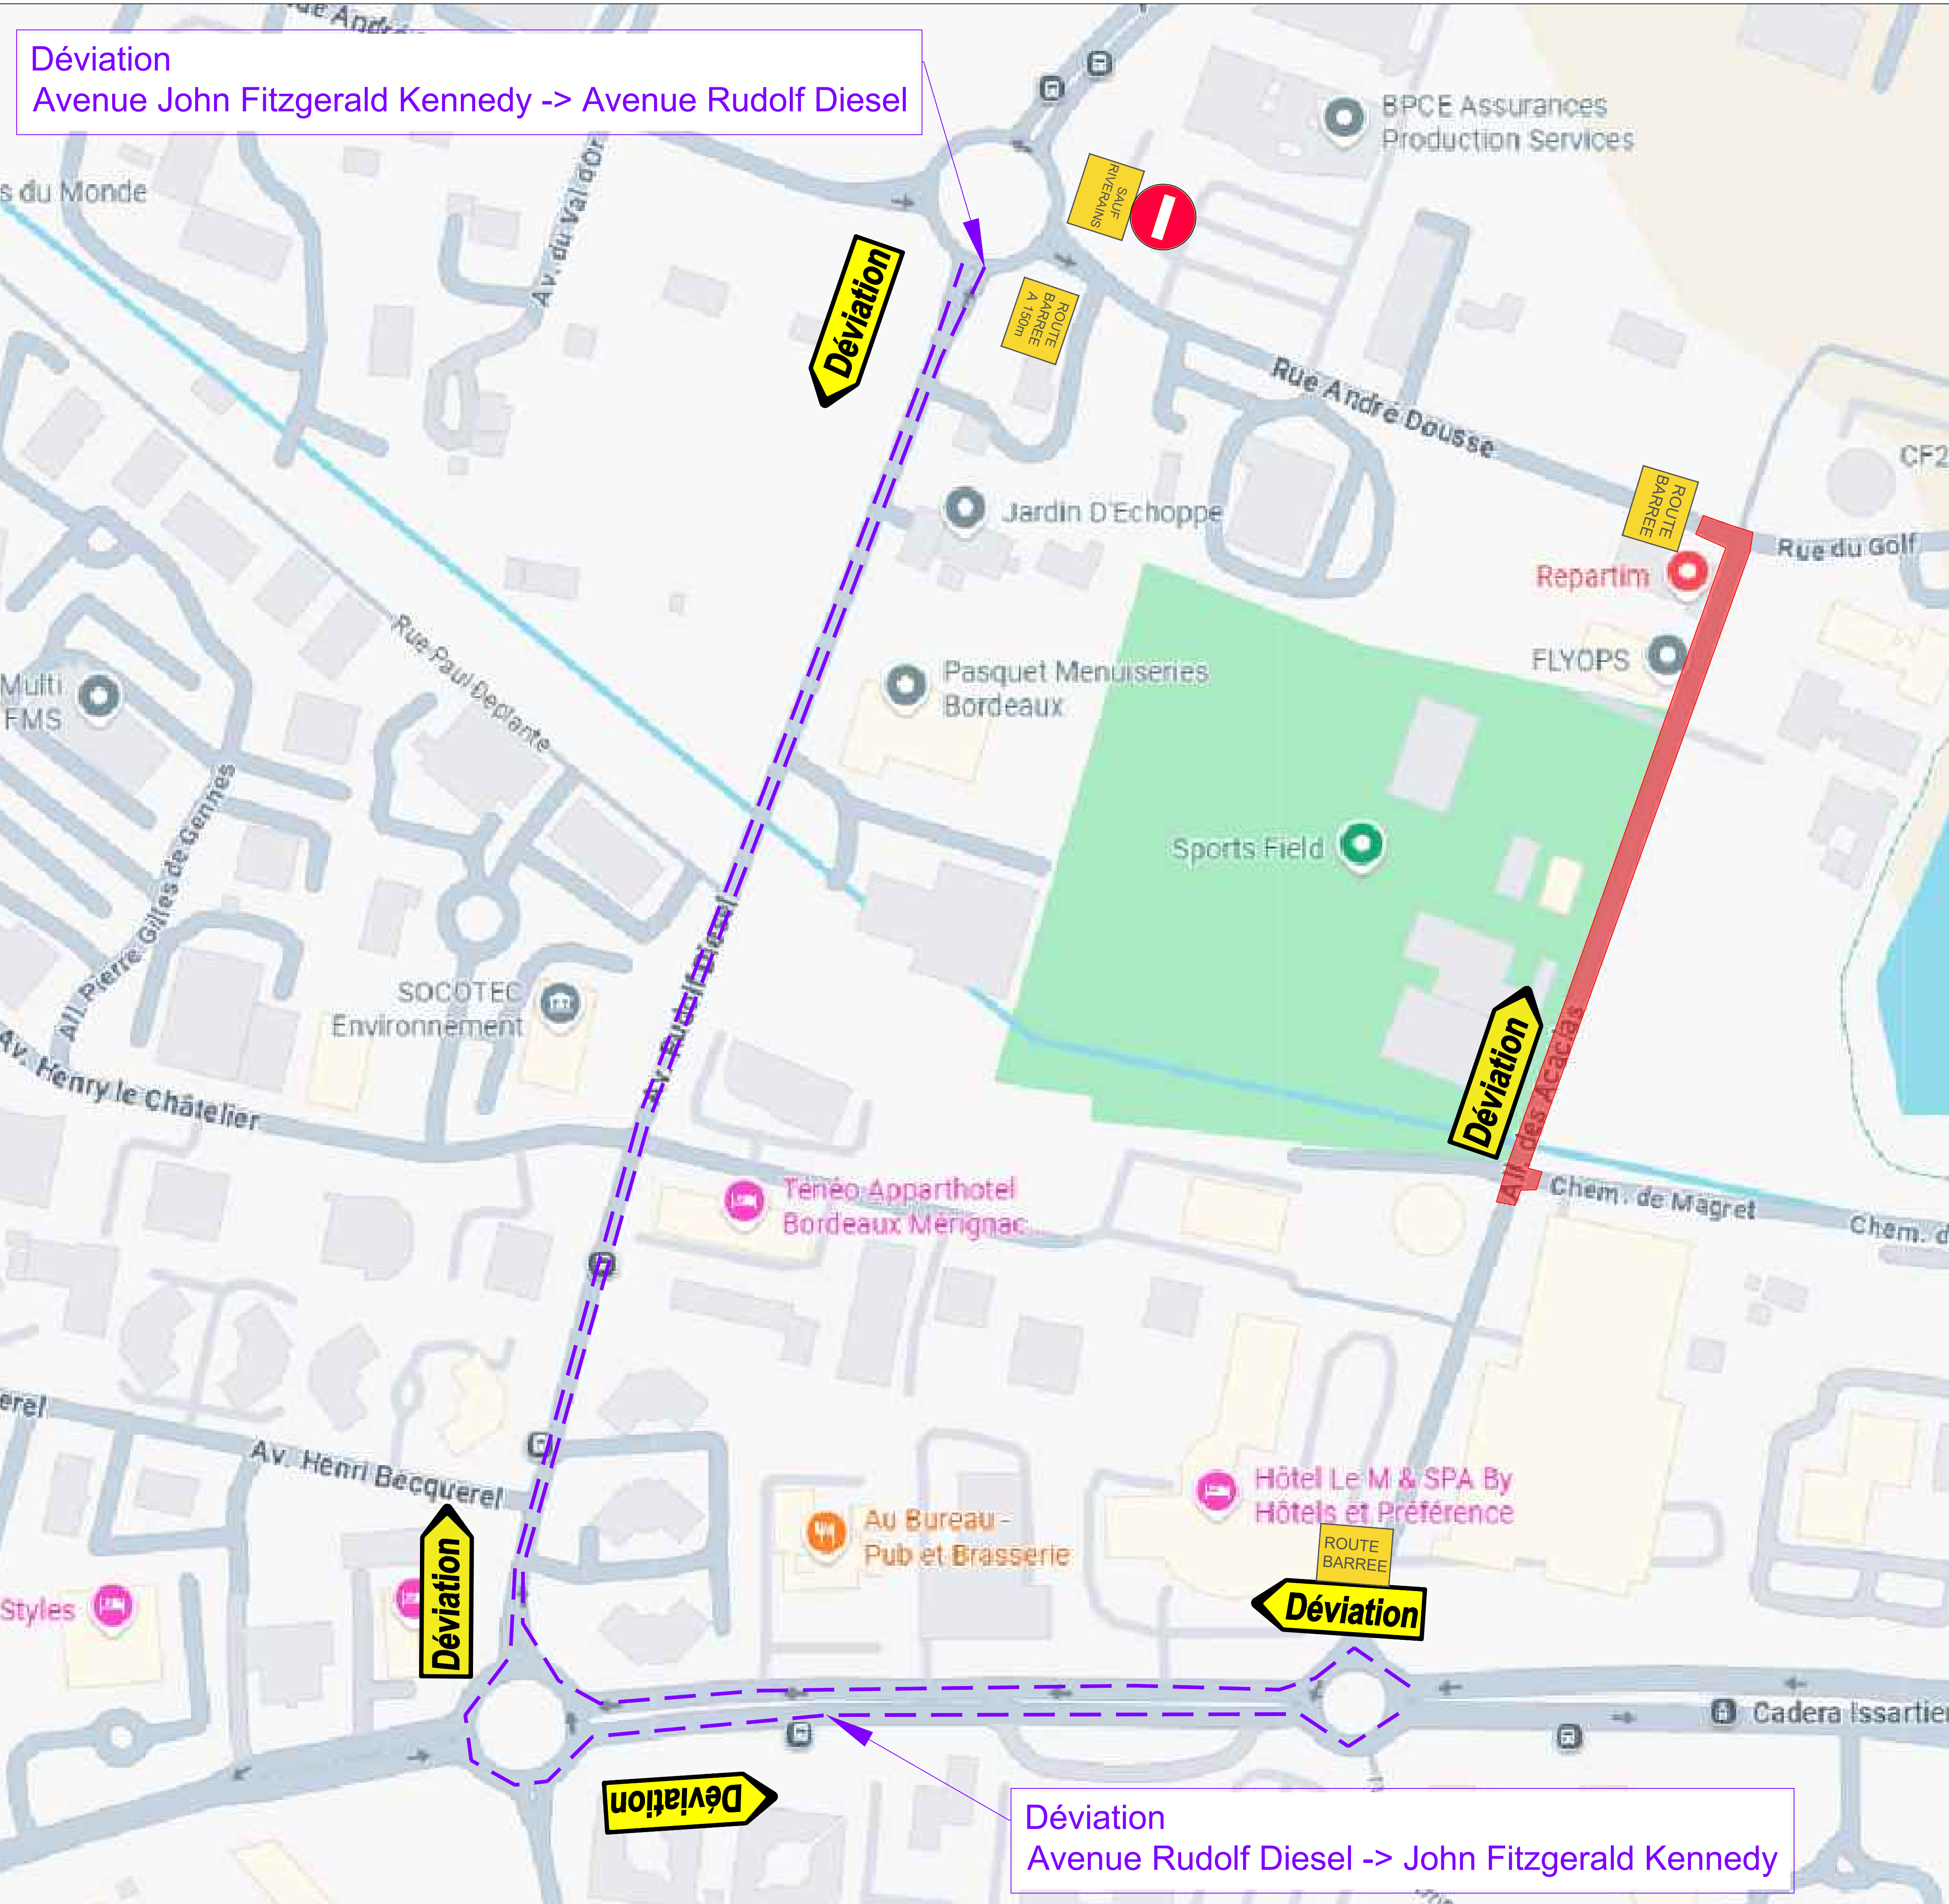

Légende

Phase B1 : 12 Janvier 2026 - 30 Janvier 2026 Hors intempérie

- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Rabotage des trottoirs
- Démolition de chaussée
- Terrassement
- Structures de chaussée et trottoir
- Bordures
- Revêtement trottoir
- Reprofilage
- Grave bitume

Zone travaux

Base vie

Balise K16

Cheminement piétons (La position du couloir piéton changera en fonction de l'avancement des travaux dans la zone concernée.)

Déviaton

Accès riverains et commerces maintenus



EUROVIA

Agence de Bordeaux

10 rue Thiers 33000 BORDEAUX

05 57 20 20 65

05 57 20 20 65

COMMUNE DE MÉRIGNAC

ALLÉE DES ACACIAS

Date	Modifications
15/07/25	Création plan
23/07/25	Modification avant travaux

PHASE B1

DUR

BBS

PHASAGE B-1

200°

Légende

Phase B2 : 2 Février 2026 - 27 Février 2026 Hors intempérie

Mise en place balisage

Dégagement d'emprise

Rabotage des enrobés

Démolition de chaussée

Terrassement

Assainissement

Structures de chaussée et trottoir

Bordures

Revêtement trottoir et résine

Reprofilage

Grave bitume

Zone travaux

Base vie

Balise K16

Cheminement piétons

Déviaton

Accès riverains et commerces maintenus



EUROVIA

Agence de Bordeaux

10 Rue Thierry BARNIER

33075 MERIGNAC CEDEX

Tel 05 57 25 00 00

Fax 05 57 25 00 01

COMMUNE DE MERIGNAC

ALLÉE DES ACACIAS

15/07/25 Edition initiale

23/07/25 Modification avant travaux

PHASE B2

DUR

BBS

PHASAGE B-2

200°

Légende

Phase B3 : 2 Mars 2026 - 2 Mars 2026 (Nuit) Hors intempérie

- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Reprofilage et BBSG
- Grenailage des accès
- Finitions

 Zone travaux




 Base vie

— Balise K16

— Cheminement piétons

■ ■ Déviation

→ Accès riverains et commerces maintenus

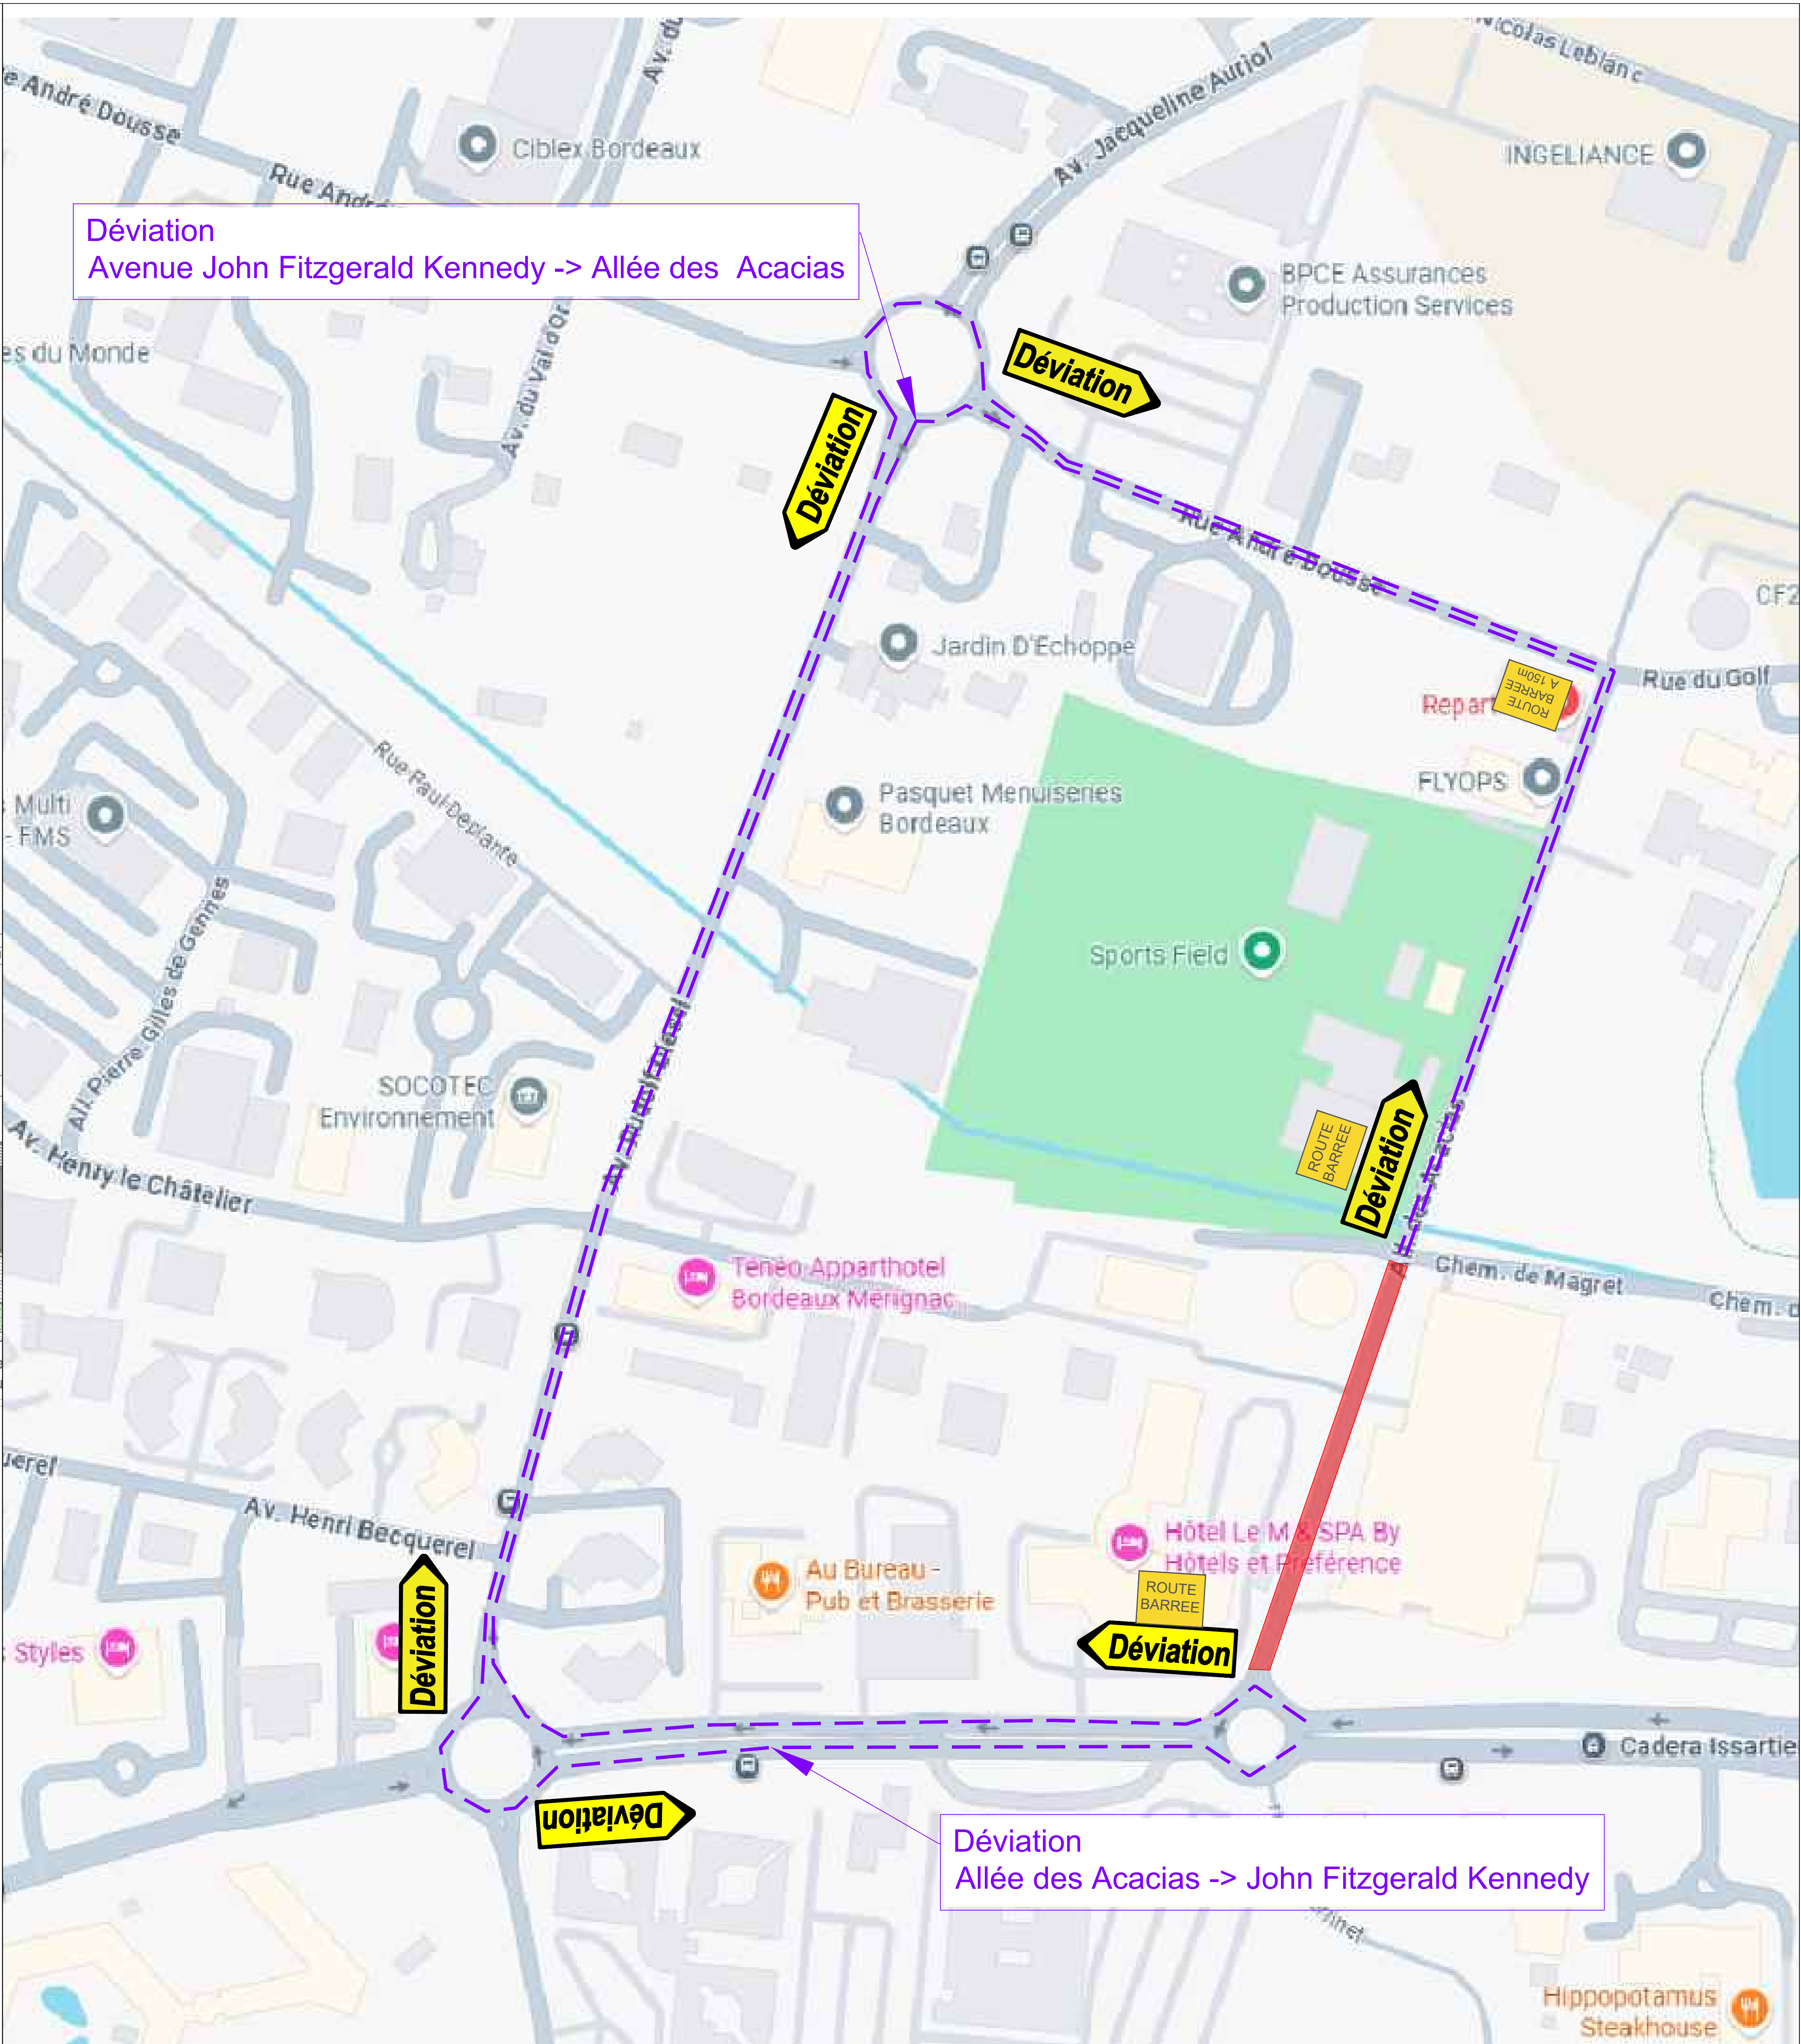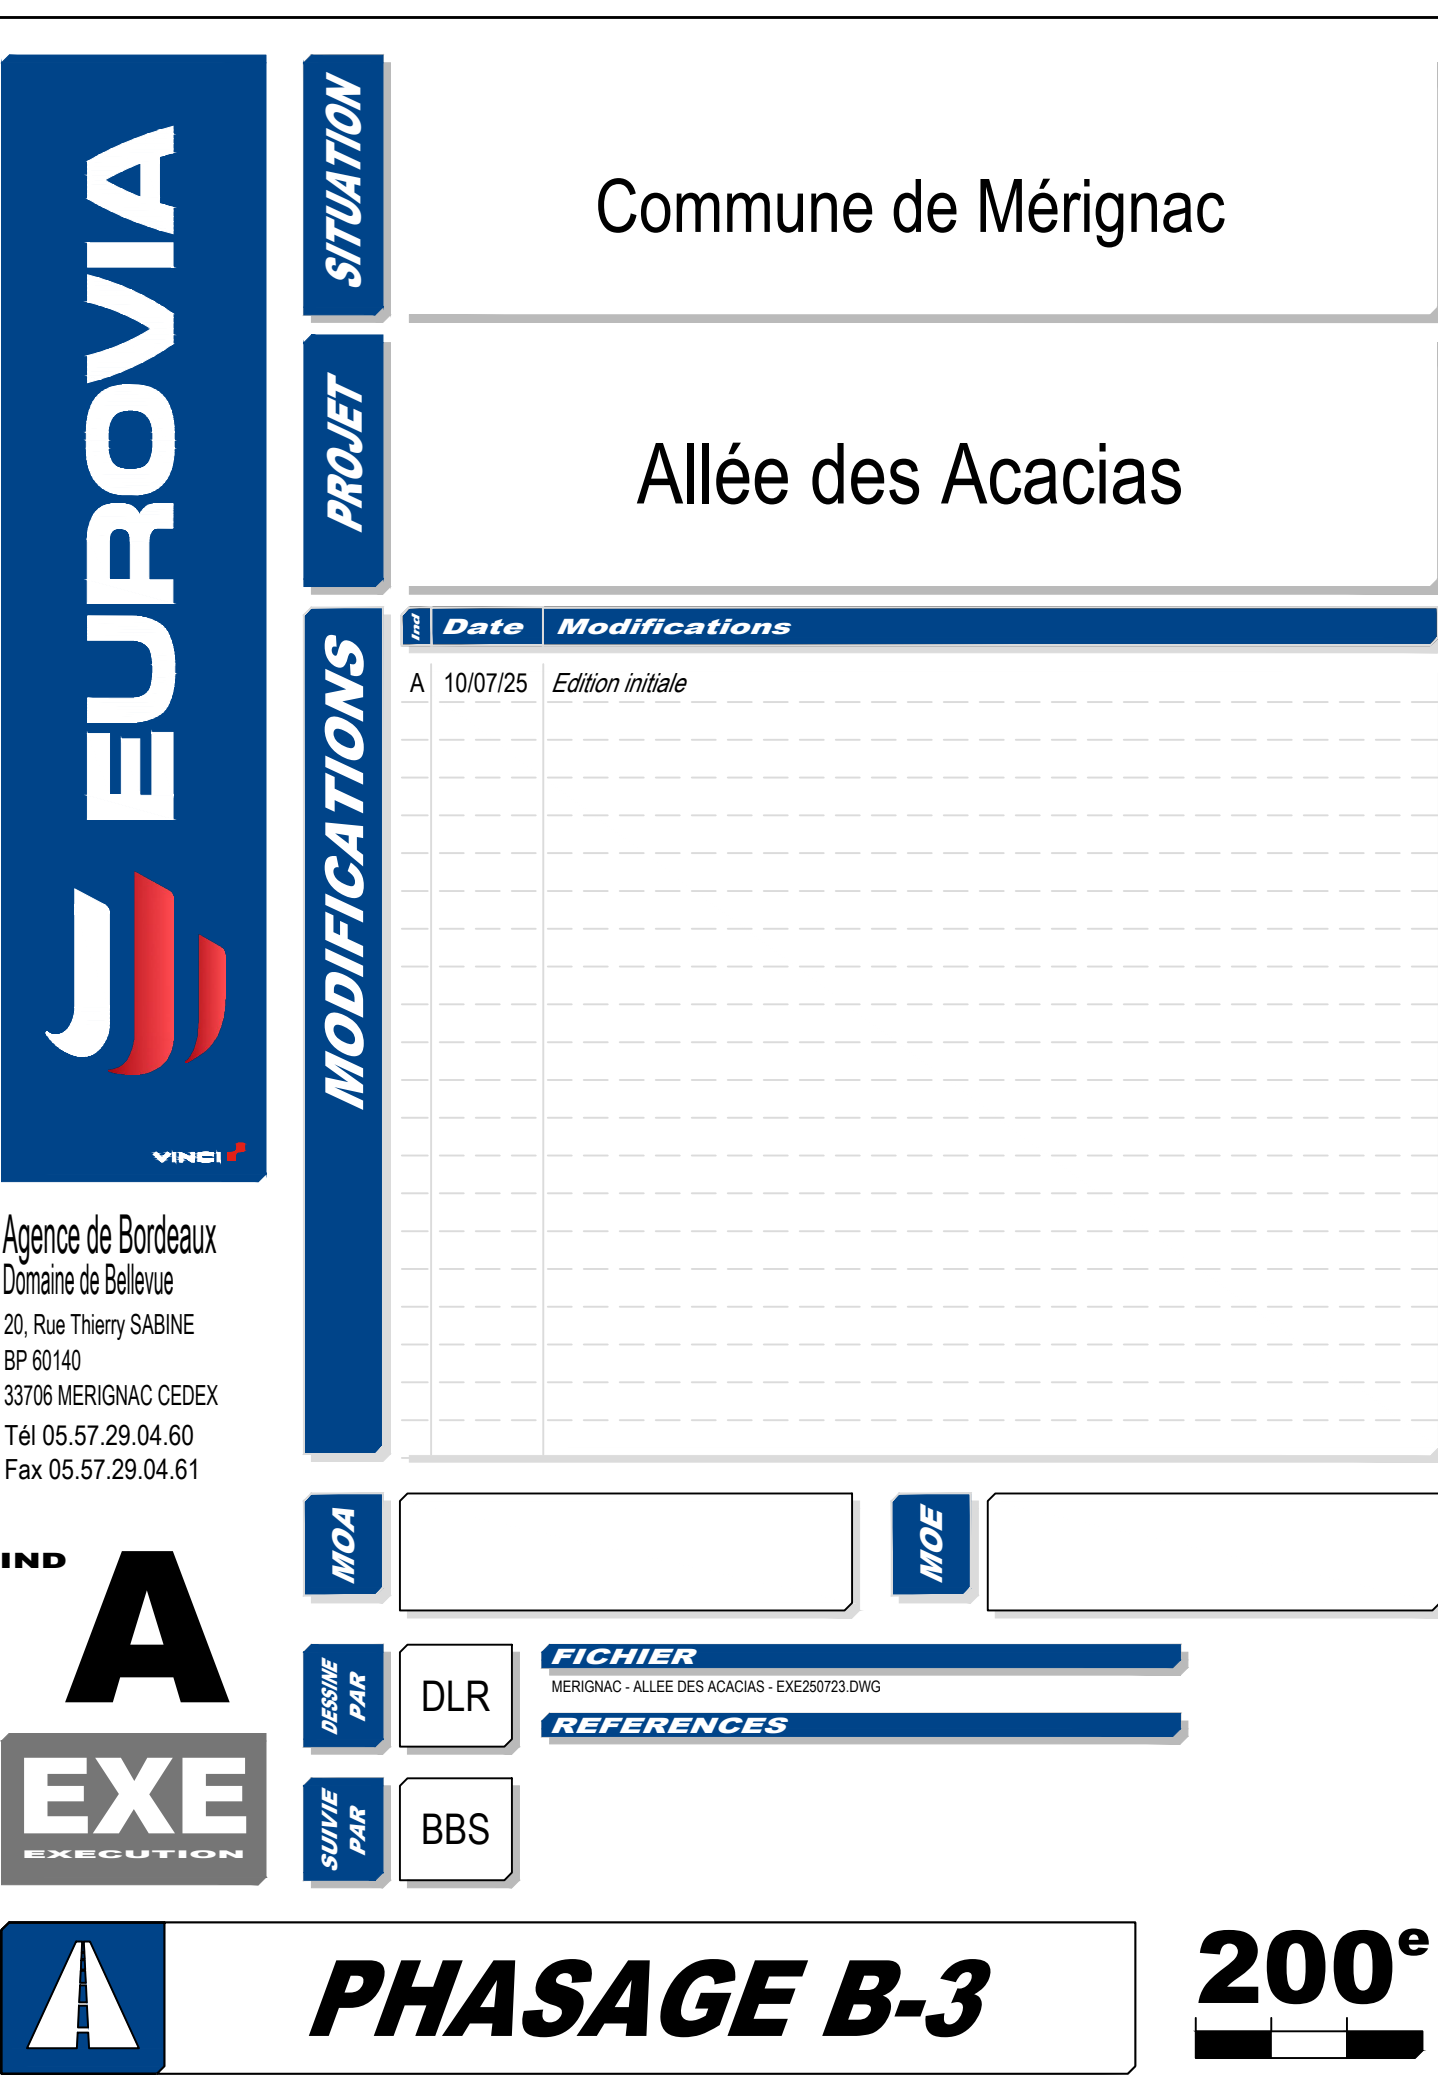

Légende

Phase C : 12 Janvier 2026 - 2 Mars 2026 Hors intempérie

- Mise en place balisage
- Dégagement d'emprise
- Terrassement
- Structure voie verte nature
- Bordures
- Stabilisé renforcé
- Finitions

 Zone travaux

 Base v

 Balise K16

— Cheminement piétons

